Smart-EMAPs ／ 生産管理

生産計画ベースライン管理 操作説明書

基準計画の固定化から、変更計画・実績との差異把握までを一画面で

- ① 基準月のベースライン生成・削除
- ② 切断・面取・メッキ・検査の手入力
- ③ 変更計画・実績との差異確認
- ④ KPI・前月・前年同月の比較
- ⑤ 日次推移と月間ヒートマップ
- ⑥ 統合レポート・Excel・印刷

対象画面	版数	作成日
計画ベースライン	第 2.0 版	2026年10月12日

目 目次

1 はじめに（目的・用語） 基準計画とは

2 画面を開く ERP → 生産計画

3 画面構成 生成・KPI・チャート・一覧

4 ベースライン生成・削除 ロック・上書き・手入力

5 基準計画の手入力 カレンダーで日付選択

6 比較条件 対象月・工程で自動再取得

7 サマリー KPI・期間比較 前月・前年同月

8 日次推移・月間ヒートマップ 工程タブ連動

9 ベースライン比較一覧 差異閾値・アラート

10 計画を修正 日付の追加・保存・削除

11 レポート・Excel・印刷 定時配信

12 操作権限（生産計画） 登録・編集・削除・出力

13 メッセージと対処 画面に出る文言

14 運用上の注意・よくある質問 トラブル対応

— 文書情報・改訂履歴 版数・作成日

本書の画面図について

画面図は 2026年10月12日 時点の「生産計画ベースライン管理」（ロック、手入力カレンダー、溶接SP、KPI、ヒートマップ、アラート）に合わせています。件数・数量は説明用の例です。1は操作する場所、Aは画面の領域を示します。

1 はじめに

1-1 画面の目的

「生産計画ベースライン管理」は、ある基準月の生産計画を**ベースライン（基準計画）**として固定し、その後の**変更計画**や**実績**との差を工程別に見る画面です。

できること	説明
生成・削除	基準月・工程のベースラインを作る、または消す。生成エリアはロックで誤操作を防ぎます
手入力	切断・面取・メッキ・検査は、カレンダーで日を選んで同じ数量を登録します
比較	基準計画・変更計画・実績・差異を日次で見ます。条件を変えると自動で読み直します
KPI・期間比較	当月の合計と、前月・前年同月の達成率を並べます
チャート	選んでいる工程タブの日次推移と、月間ヒートマップを表示します
出力	Excel、工程をまとめたレポート PDF、表示中タブの印刷

1-2 用語

用語	意味
基準計画	ベースライン生成（または手修正）で固定した日次の計画数量
変更計画	いまの計画数量。切断・面取・メッキ・検査は基準計画と同じ。成型は molding_plan。溶接／溶接SP は welding_actual_plan
計画差異	変更計画 − 基準計画。プラスは増加、マイナスは減少
計画対実績差	基準計画 − 実績。実績が無い日は「-」
溶接SP	製品名 FE-7・CH2 RR。溶接とは別工程として集計

例 基準計画 52,000・変更計画 50,400 なら計画差異は −1,600。実績 41,200 なら計画対実績差は +10,800（基準の方が実績より多い）。

2 画面を開く

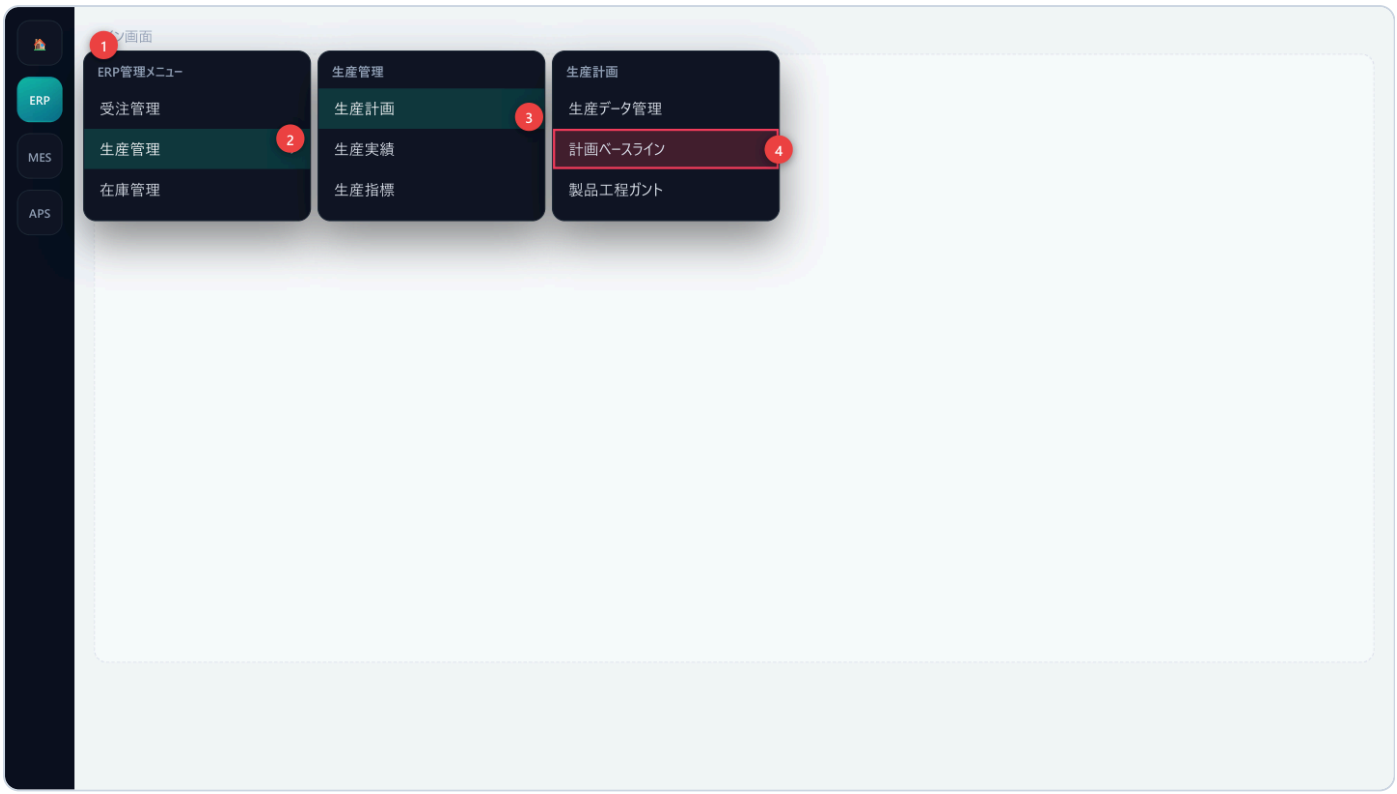


図 2-1　サイドバーから開く（ERP → 生産管理 → 生産計画 → 計画ベースライン）

1. Smart-EMAPs にログインします。
2. 左サイドバーの `ERP` にマウスを置きます（図 2-1 の 1）。「ERP管理メニュー」が開きます。
3. `生産管理` にマウスを置きます（2）。
4. `生産計画` にマウスを置きます（3）。
5. `計画ベースライン` をクリックします（4）。画面タイトル「生産計画ベースライン管理」が表示されます。

> **メニューに「計画ベースライン」が無いとき**
> ロールにこの画面のメニュー権限がありません。管理者に付与を依頼してください。パスは `/erp/production/plan-baseline` です。ヘッダーの ? から本書を開けます。

3 画面構成

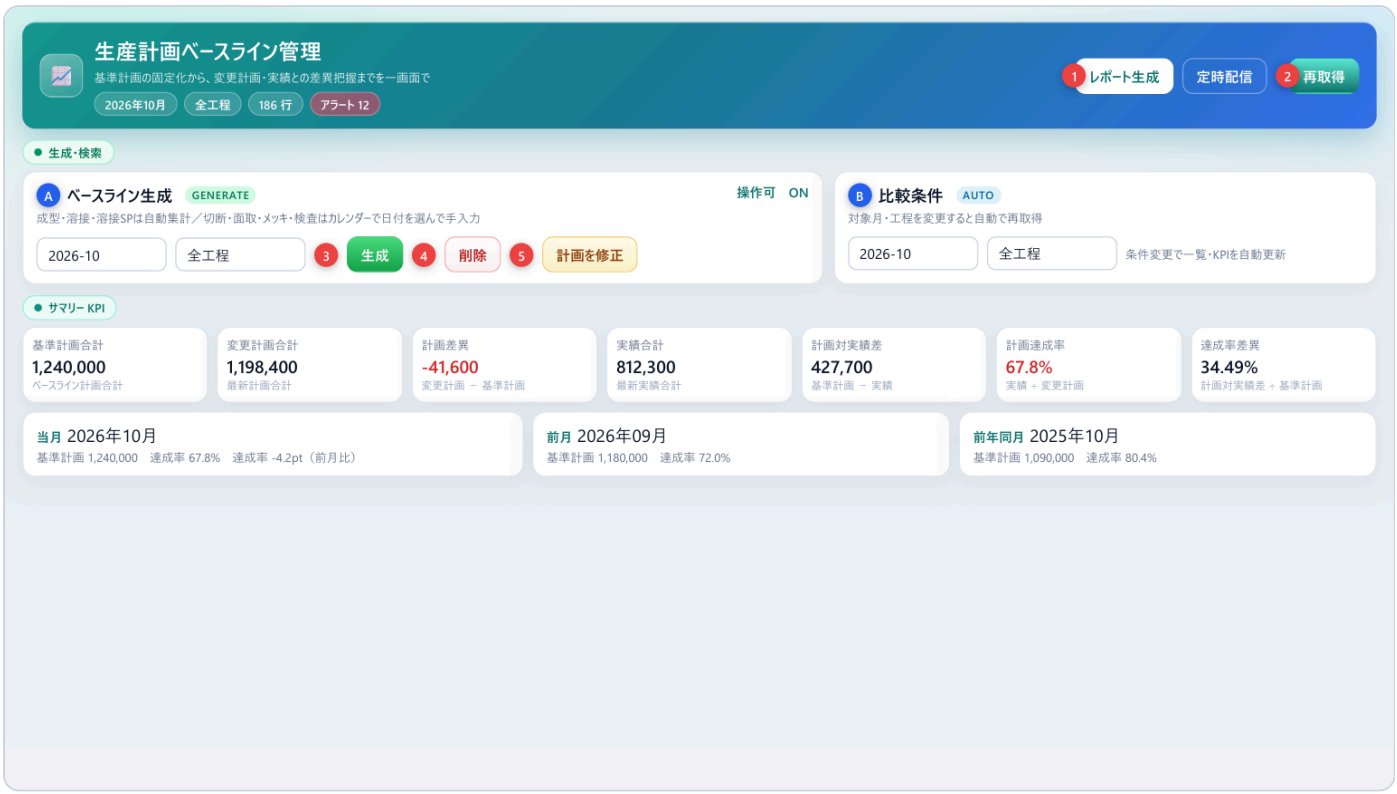


図 3-1　ヘッダー・生成／比較・KPI。A生成、B比較、1レポート、2再取得、3生成、4削除、5計画を修正

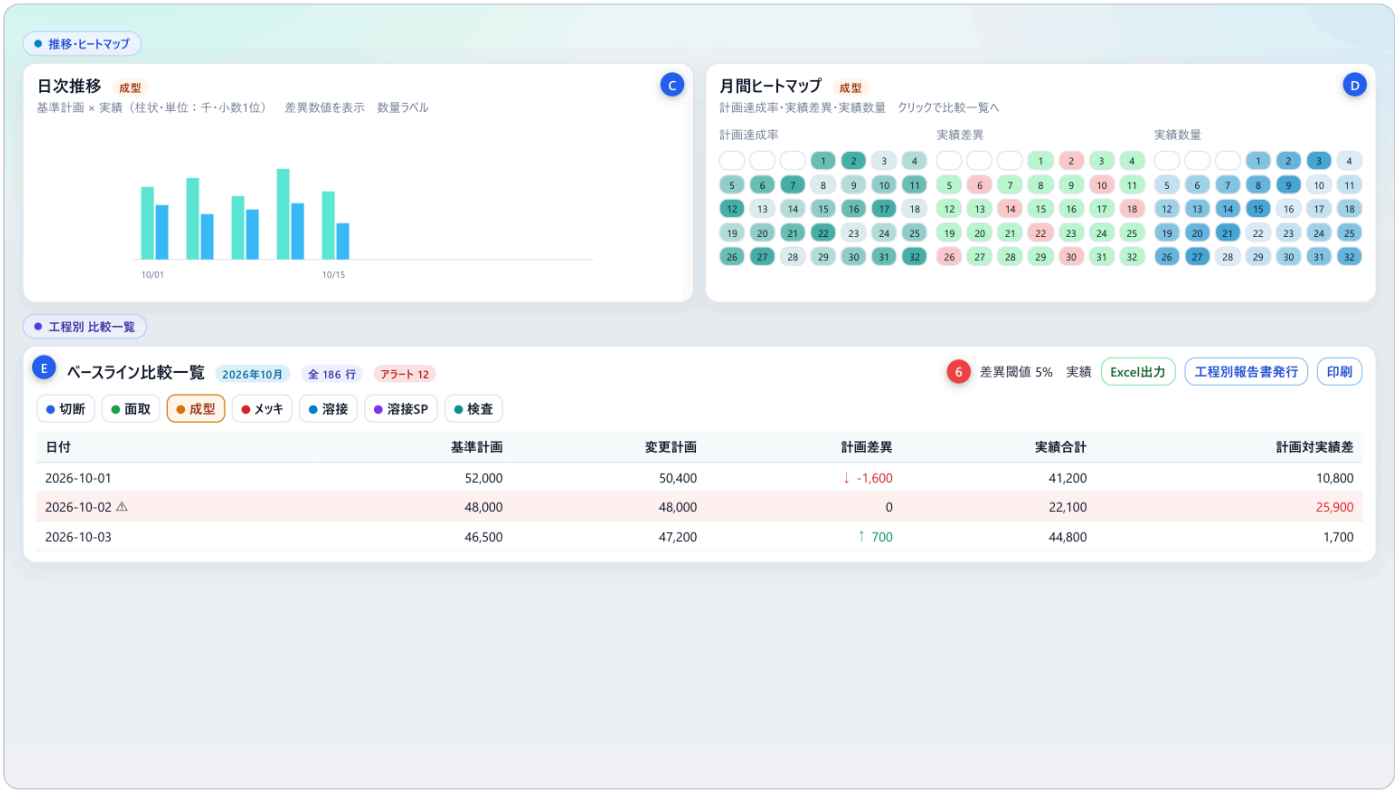


図 3-2　チャートと比較一覧。C日次推移、Dヒートマップ、E一覧、6閾値と出力

No	エリア	説明
A	ベースライン生成	基準月・工程、生成／削除／計画を修正。スイッチでロック
B	比較条件	対象月・工程。変更すると一覧と KPI を自動更新
C	日次推移	選択中工程タブの基準計画と実績（単位: 千）
D	月間ヒートマップ	計画達成率・実績差異・実績数量。日付クリックで一覧へ
E	比較一覧	工程タブ、日次表、アラート、Excel／報告書／印刷

3-1 操作ボタン

No	ボタン	動き	参照
1	レポート生成	比較がある工程を 1 つの PDF にまとめ、印刷ダイアログを開く	第 11 章
2	再取得	比較条件で一覧・KPI を読み直す	第 6 章
3	生成	ロック ON のとき、基準月のベースラインを作る	第 4・5 章
4	削除	その月・工程のベースラインを消す（取り消せない）	第 4 章
5	計画を修正	日別数量の修正ダイアログを開く	第 10 章
6	Excel出力	表示中の比較を .xlsx でダウンロード	第 11 章

4 ベースライン生成・削除

4-1 ロック

初期状態は**ロック中**です。スイッチを ON（「操作可」）にしてから 生成 削除 計画を修正 を使います。

4-2 生成手順（成型・溶接・溶接SP・全工程）

1. ロックを ON にします。
2. 基準月を選びます。
3. 工程を「全工程」または成型／溶接／溶接SP にします。
4. 生成 を押します。自動集計分は上書きされます。切断・面取・メッキ・検査の手入力は、この再生成では消えません。

4-3 削除手順

1. ロック ON、基準月、消したい工程（空ならその月の対象工程）を指定します。
2. 削除 を押し、確認します。成功すると「ベースラインを削除しました」。取り消せません。

注意： 切断・面取・メッキ・検査を工程指定して生成すると、手入力ダイアログが開き、その工程は選び直した日だけに作り直されます（第 5 章）。

5 基準計画の手入力

工程が切断・面取・メッキ・検査のとき、生成 を押すと「基準計画の手入力」が開きます。



図 5-1　手入力ダイアログ。1 選択日共通の数量、2 生成する

窓体項目	説明
工程チップ	右上に対象工程（切断／面取／メッキ／検査）
対象月・選択日数	生成エリアの基準月。選択中の日数
平日のみ　すべて　クリア	既定は平日。日付セルのクリックで追加・解除
基準計画数（選択日共通）	選んだ日すべてに同じ数量。0 以上
注意文	既存のその工程ベースラインは削除され、選択日だけに登録される
生成する／キャンセル	実行または閉じる

1. カレンダーで日を選びます（土日が必要ならクリックして追加）。
2. 数量を入れ、生成する を押します。

> i 日が 0 のときは「反映する日付を1日以上選択してください」。数量が空または負のときは「基準計画数を入力してください（0以上）」です。

6 比較条件

比較条件に検索ボタンはありません。対象月・工程を変えると自動で読み直します。すぐ読み直すときはヘッダーの 再取得 です。生成・削除のあと、比較条件は生成側の月・工程に同期します。

7 サマリー KPI・期間比較

カード	意味
基準計画合計	ベースライン計画合計
変更計画合計	最新計画合計
計画差異	変更計画 − 基準計画
実績合計	最新実績合計
計画対実績差	基準計画 − 実績
計画達成率	実績 ÷ 変更計画
達成率差異	計画対実績差 ÷ 基準計画合計

その下に当月・前月・前年同月の基準計画と達成率を並べます。当月には前月比の達成率差が出ます。変更計画合計が 0、または実績が無いときは達成率は「-」です。

8 日次推移・月間ヒートマップ

8-1 日次推移

棒は基準計画と実績です。単位は千、小数第 1 位です。差異は実績 − 基準計画で、実績が無い日は出しません。**差異数値を表示**と**数量ラベル**で数字の出し入れができます。

8-2 月間ヒートマップ

パネル	見方
計画達成率	低い日ほど薄く、高い日ほど濃い
実績差異	単位は千。負は赤寄り、正は緑寄り
実績数量	単位は千

日付のマスをクリックすると、下の比較一覧でその日の行まで移動し、しばらく強調されます。

9 ベースライン比較一覧

9-1 タブ

データが 1 件以上ある工程だけがタブになります。並びは 切断、面取、成型、メッキ、溶接、溶接SP、検査 です。タブにアラートがあると件数の印が付きます。

9-2 列

列	内容
日付	YYYY-MM-DD。アラートの日は警告。マウスを置くと理由
基準計画	生成時に固定した値
変更計画	いまの計画。切断・面取・メッキ・検査は基準計画と同じ
計画差異	変更計画 − 基準計画
実績合計	在庫取引の日次実績。無い日は「-」
計画対実績差	基準計画 − 実績

9-3 差異閾値（アラート）

差の絶対値が閾値（%）を超えた行を強調します。初期値は **5%**、監視は**実績**のみ ON、**計画**は OFF です。**アラートのみ**にするとそのタブはアラート行だけになります。設定はブラウザに保存されます。

10 計画を修正

ロックを ON にし、**計画を修正** を押すと「ベースライン計画修正」が開きます。基準月と工程は生成エリアの値が初期値です。

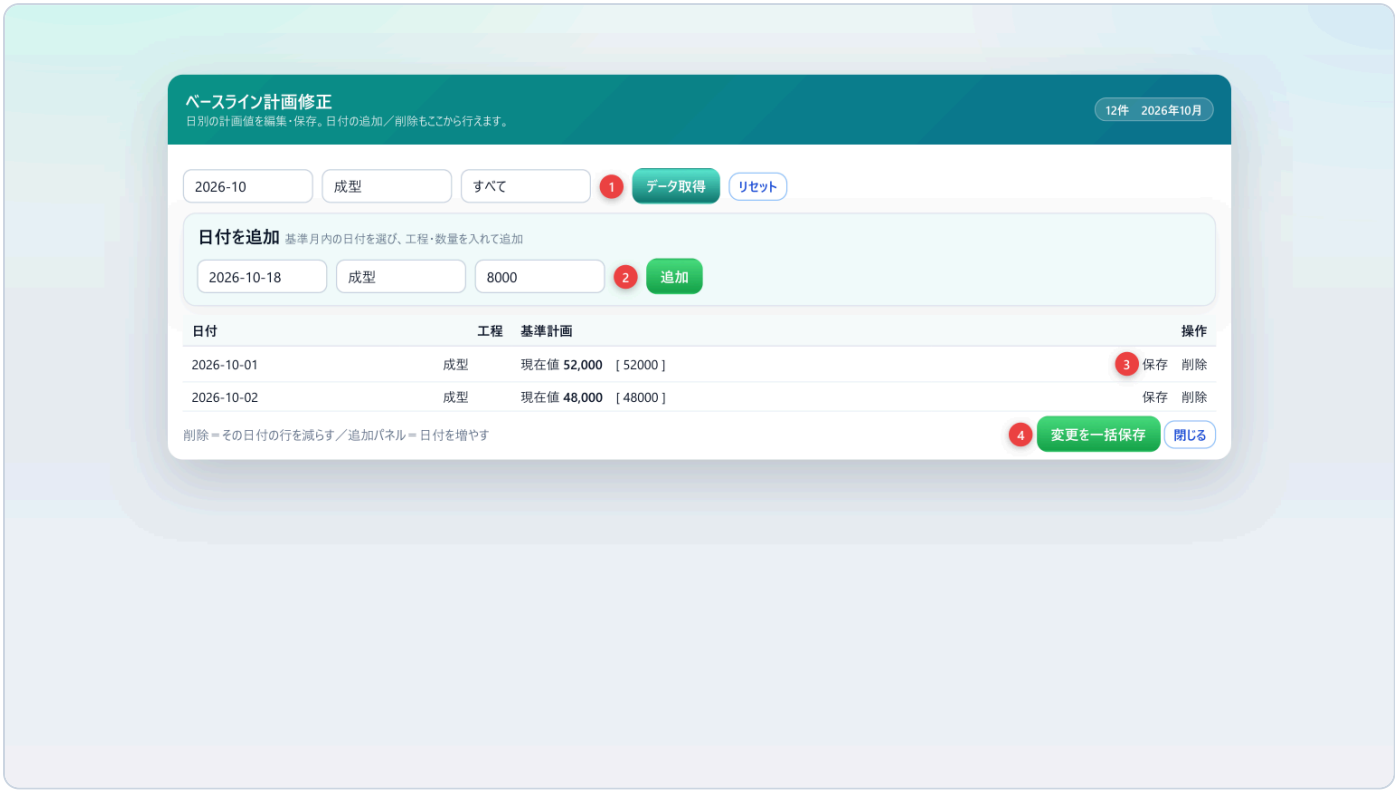


図 10-1　計画修正。1データ取得、2日付の追加、3行の保存、4一括保存

窗体項目	説明
基準月・工程・表示	表示は すべて／編集あり／比較アラート日
データ取得 ／リセット	読み直し。リセットは月を戻し工程を空にして一覧を空にする
日付を追加	基準月内の日付、工程、0 以上の数量。**追加**
行の保存／削除	その行だけ即時保存、またはその日・工程の行を削除（確認後、取り消せない）
変更を一括保存	現在値と違う行だけ順に保存。差が無いときは「変更された項目がありません」
閉じる	未保存の入力は残りません

0 件のときは「該当するデータがありません。上から日付を追加できます」。同じ日・工程が既にあるときは入力欄へ写し、「既存行の数量を更新しました。保存してください」と出ます。数量欄では矢印キーと `Enter` で上下の行へ移動できます。

11 レポート・Excel・印刷

11-1 レポート生成

ヘッダーの レポート生成 と一覧の 工程別報告書発行 は、比較データがある工程を 1 つの PDF にまとめてサーバーへ保存し、そのあとブラウザの印刷ダイアログを開きます。処理中は「レポート生成」の進捗が出て、閉じられません。



図 11-1　レポート生成の進捗ダイアログ（閉じられない）

1. 比較条件で出したい月にし、一覧に行があることを確認します。
2. レポート生成 または 工程別報告書発行 を押します。
3. 「統合レポートPDFを保存しました」のあと、印刷ダイアログが開きます。PDF は工程ごとに日次表とチャートの 2 ページです。

11-2 定時配信

定時配信 は報告センターのスケジュールタブを開きます。毎週金曜 19:00 に自動生成し、メールに添付します。

11-3 Excel 出力

一覧の Excel出力 は .xlsx をダウンロードします。ファイル名の例は `生産計画ベースライン比較_2026-10.xlsx` です。シートはサマリー、工程ごと、アラートがあるときはアラート一覧です。

11-4 印刷

一覧の 印刷 は、いま開いている工程タブの表だけをブラウザ印刷します。行が無いときは「印刷するデータがありません」です。

12 操作権限（生産計画）

ボタンは見えていても、生産計画モジュールの操作権限が無いと「生産計画の操作権限がありません」と出て処理は始まりません。

権限	できる操作
参照	画面を開く、比較条件、KPI、チャート、一覧の閲覧
登録	生成、手入力の生成、変更の一括保存
編集	計画修正の行保存、日付の追加
削除	月・工程の削除、計画修正での行削除
エクスポート	レポート生成、工程別報告書発行、Excel出力、印刷

13 メッセージと対処

メッセージ	意味と対処
対象月を選択してください	基準月が空で生成または削除した
反映する日付を1日以上選択してください	手入力で日が 0
基準計画数を入力してください（0以上）	数量が空、または 0 未満
ベースラインを生成しました	生成成功
ベースラインを削除しました	削除成功。取り消せない
比較データの取得に失敗しました	再取得する
既存行の数量を更新しました。保存してください	同じ日・工程がある。行の保存か一括保存が必要
変更された項目がありません	一括保存時に差分が無い
生産計画の操作権限がありません	権限が無い。管理者に依頼
統合レポートPDFを保存しました	サーバ保存成功。続けて印刷ダイアログ
Excelを出力しました	ダウンロード成功

14 運用上の注意・よくある質問

1. **生成の前にロックを ON にしてください。**
2. **自動生成は上書き、手入力工程は別です。** 切断・面取・メッキ・検査の手入力は、全工程や成型・溶接の再生成では消えません。
3. **溶接と溶接SP を混ぜないでください。** FE-7 と CH2 RR は溶接SP です。
4. **アラートの初期は実績だけです。** 計画のぶれも見たいときは「計画」にチェックを入れます。
5. **印刷とレポートは別です。** 印刷は開いている工程タブの表だけです。

質問	答え
検索ボタンはどこですか	ありません。対象月・工程を変えると自動で読み直します
操業度カードはどこですか	現行のこの画面にはありません。設備の操業度は成型計画など各計画画面で確認してください
手入力の土日が消えました	生成時の初期選択は平日だけです。土日が必要ならクリックして選んでください
達成率が「-」です	変更計画の合計が 0、または実績が無いときです

一 文書情報

項目	内容
文書名	生産計画ベースライン管理 操作説明書
対象	ERP → 生産管理 → 生産計画 → 計画ベースライン
画面パス	/erp/production/plan-baseline
版数	第 2.0 版
作成日	2026年10月12日
スタイル正本	月受注管理 操作説明書（order-monthly.pdf）に準拠
言語	日本語

一 改訂履歴

日付	版	内容
2026-10-12	2.0	月受注管理と同スタイルで全面改訂。メニュー・画面構成・手入力・計画修正・レポート進捗の図と窗体説明を追加
2026-10-09	1.0	現行画面に合わせて初版（様式見直しのため 2.0 に置換）

以上。ボタン名は 2026年10月12日時点の画面表示と一致します。
